

Руководителю  
Государственной инспекции  
Алтайского края

исх. №17 от 28.01.2019г

## Информационное письмо

ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" информирует, что в период ноябрь- декабрь 2018г и январь 2019г на объекте капитального строительства *«Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, с подземной автостоянкой. 2 этап строительства – Блок-секция №3, блок-секция №4, подземная автостоянка»*, по адресу: Алтайский край, г.Барнаул проспект Ленина 195а, выполнены следующие виды строительно-монтажных работ:

### 1. Общестроительные работы:

- завершен монтаж каркаса здания;
- интенсивно идет изготовление и монтаж оконных блоков, витражей, фото №1-3, завершения остекления блок - секции №3 планируется в срок до 15.02.2019г, блок - секции №4 в срок до 30.03.2019г.
- завершены работы по кладке помещений кладовых на отм -3,100м, фото №5
- установлены противопожарные двери в электрощитовых, вентиляционном помещении, в машинных отделениях лифтов и т.д.) фото №6;
- полным ходом идут работы по строительству подземной автостоянки, на данный период времени выполнены работы по устройству фундаментной плиты и произведен монтаж фундаментных блоков стен автостоянки, Фото №4, завершение работ 15.05.2019г.

### 2. Электромонтажные работы:

- завершена прокладка электрокабельной продукции по квартирам;
- ведутся работы по монтажу электрооборудования (выключатели, розетки, автоматы, электросчетчики и т.д.) фото №7, №7.1

### 3. Система отопления и водоснабжения, ведутся работы по:

- монтажу вертикальных стояков отопления, горячего водоснабжения;
- устройству по этажным гребенкам системы отопления и ГВС;
- монтаж трубопроводов системы отопления по квартирам и местам общего пользования.

Начало тестирования системы отопления, запланирован на 07.02.2019г, в первую очередь будут проверены магистральные трубопроводы на плотность и герметичность.

Запуск системы отопления будет производиться поэтапно после проведения тестирования магистралей и закрытия теплового контура в зоне запуска.

4. Действие разрешение на строительство «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, с подземной автостоянкой. 2 этап строительства – Блок-секция №3, блок-секция №4, подземная автостоянка» по адресу: Алтайский край, г.Барнаул проспект Ленина 195а №22-RU22302000-252-2018 от 13.07.2018г. продлено до 23 июня 2019г.

5. Всем желающим участникам долевого строительства дома, можно произвести осмотр своих квартир в сопровождении начальника участка.

Запись проводится в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по телефону сот. 8 933 310 33 34 Начальник участка Казаков Виталий Викторович или 8(3852) 85-80-77 отдел продаж ООО Монтажная компания ПР-Холдинг.

Первый заместитель  
директора ООО «Монтажная  
компания  
ПР-Холдинг»



Е.Д. Клейнатовский

Фото №1

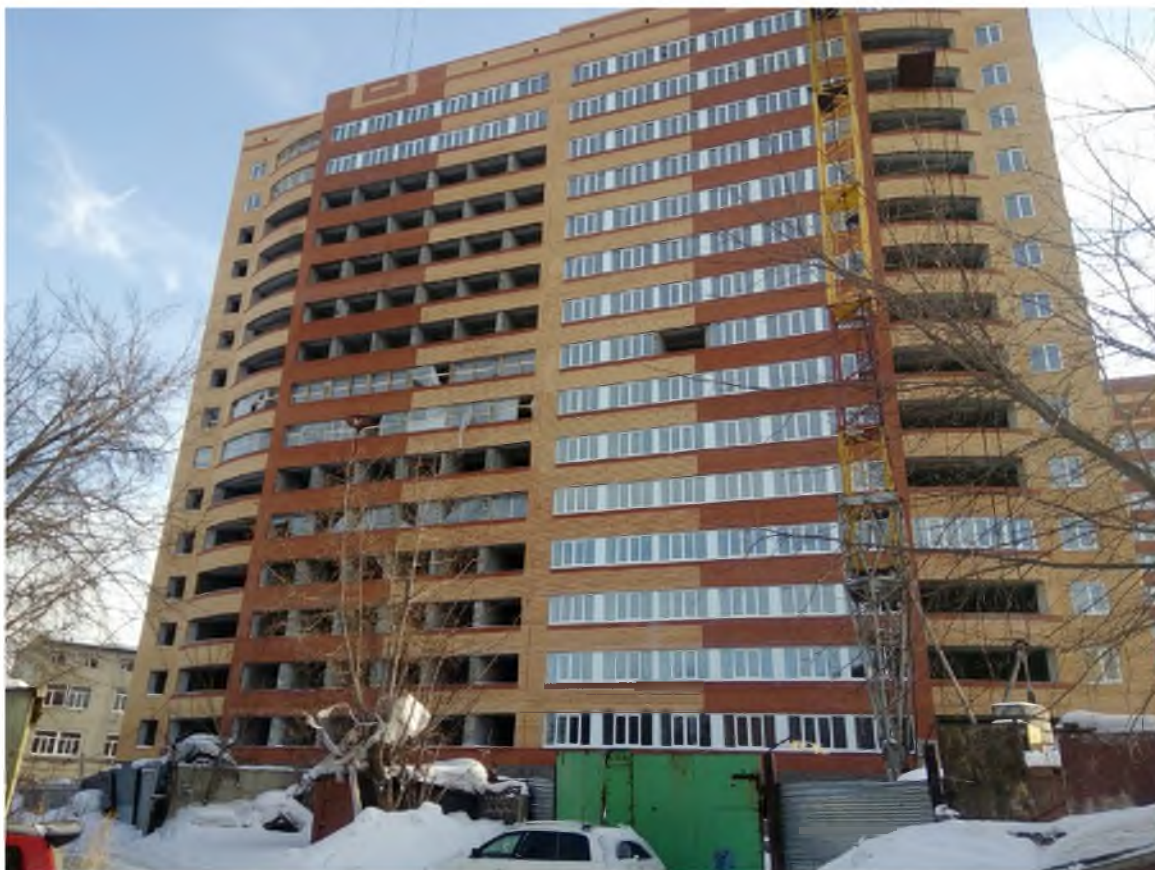


Фото №2



Φοτο Νο3



Φοτο№3.1



Фото №3.2



Фото № 3.4



Фото №4



Φοτο Νο5





Фото №6



Фото №7



Φοτο№7.1



Φοτο Νο



Фото №9

